

指定廃棄物等の学校外保管に向けた取り組み状況について（報告）

横浜市立学校及び横浜市内の保育園に保管されている指定廃棄物等の学校外保管に向けた取組状況について、次のとおり報告します。

1 新設する保管庫の整備状況

- (1) 平成28年10月11日 保管庫新築工事の契約締結（三武建設株式会社）
- (2) 平成28年11月～ 工事着工


※現在、基礎工事を施工中

廃棄物等保管庫新築工事		工程表												期間 H28.10.11~H29.3.10		三武建設株式会社						
		10			11			12			1			2			3			4		
準備期間		—————																				
		現時点																				
基礎工事(杭・基礎等)		—————																				
躯体工事(床・壁等)											—————											
仕上げ工事											—————											
外構工事											—————											
検査・片付け											—————											

2 移動時期の目途

春休み中の3月下旬を予定しています。詳細な日程が決まり次第、報告します。

<保管庫完成イメージ>

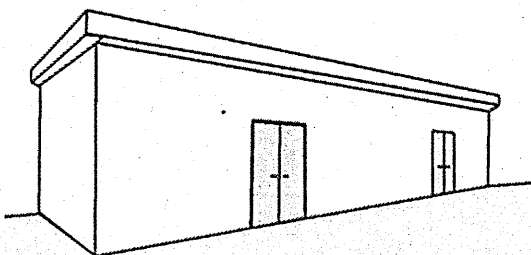

<現在の工事状況>11月下旬

