

## 市内小学校の体育館改修工事で検出された繊維状物質のアスベスト成分の分析結果について

山王台小学校における体育館改修工事において、10月17日（月）に実施したアスベスト濃度測定で検出された繊維状物質について分析を行った結果、アスベスト繊維濃度数が目安値以下であり、安全が確認されました。

そのため、10月29日（土）から工事を再開します。アスベスト含有建材の撤去が完了するまでの間は、引き続き濃度測定を実施します。万が一、目安値を超える繊維状物質が再度検出された場合は、すぐに作業を中止します。

※ 目安値：「石綿排出作業による大気汚染の防止に関する指導基準」におけるアスベストを含有する建材の撤去工事の漏えい監視の目安値

## 1 工事概要

工事件名：山王台小学校体育館改修その他工事（建築工事）  
工事場所：磯子区磯子五丁目2番1号  
工事期間：令和4年5月30日から令和5年2月28日まで  
施工者：岡山建設株式会社  
工事監理：株式会社矢野建築設計事務所

## 2 経緯

8月15日（月） 外壁材の撤去開始。濃度測定を実施。（測定①）→目安値以下  
16日（火）から18日（木）まで 外壁材の撤去実施  
29日（月） 濃度測定を実施。（測定②）→目安値以下  
9月2日（金） 午後から屋根材の撤去開始。  
5日（月） 屋根材の撤去実施。（測定③）→目安値を超える繊維状物質を検出  
6日（火） 屋根材の撤去は中断。  
7日（水）、12日（月）、20日（火）及び26日（月）に濃度測定を実施。  
（測定④～⑦）→目安値以下  
29日（木） 測定③で検出された繊維状物質から目安値を超えるアスベストが検出  
10月3日（月）及び11日（火）に濃度測定を実施。（測定⑧⑨）→目安値以下  
17日（月） 濃度測定を実施。（測定⑩）→目安値を超える繊維状物質を検出  
19日（水）から26日（水）まで濃度測定を実施。（測定⑪～⑬）→目安値以下  
26日（水） 測定⑩で検出された繊維状物質に含まれるアスベストは目安値以下

※ アスベスト含有建材の撤去に関する作業は、9月6日以降は実施していません。


## 3 濃度測定箇所及び測定結果

別紙1及び別紙2を参照


お問合せ先

建築局学校整備課長 寺口 達志 Tel 045-671-2912

■ 濃度測定箇所



10/17 測定時の風  
南西から 0.4m/s

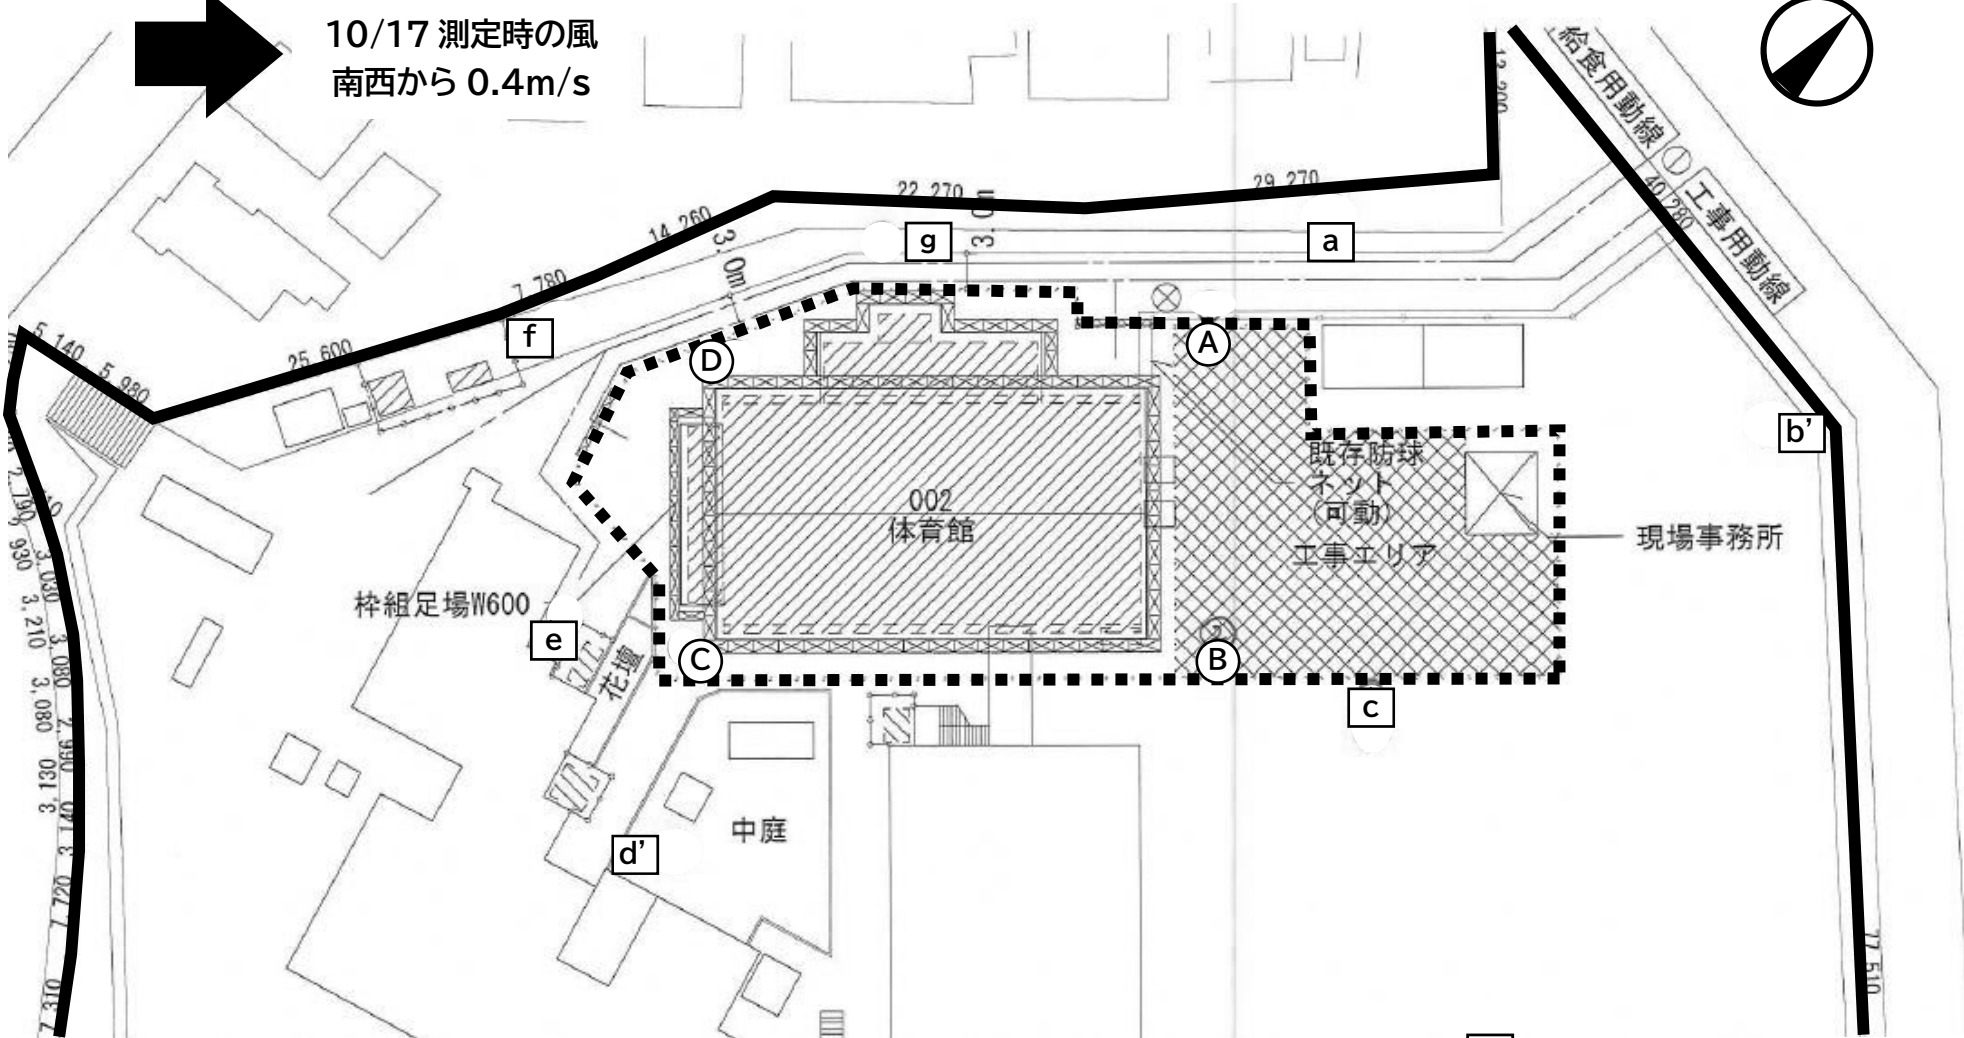

— 敷地境界  
- - - 工事エリア

□ a 工事エリア外測定箇所  
○ A 工事エリア内測定箇所

# ■ 測定結果

別紙 2

(単位：f/ℓ) ※1

測定回	測定日	風向	風速 (単位:m/s)	測定箇所										
				A	B	C	D	a	b <sup>^</sup>	c	d <sup>^</sup>	e	f	g
8/15 (測定①) 及び 8/29 (測定②) に濃度測定を実施。 → 目安値以下														
測定③	9/5	東	0.9	0.17	0.28	<u>7.8</u>	<u>22</u>	—	—	—	—	—	—	—
成分分析	9/29(※2)			—	—	<u>18</u>	<u>25</u>	—	—	—	—	—	—	—
9/7 (測定④)、9/12 (測定⑤)、9/20 (測定⑥)、9/26 (測定⑦)、10/3 (測定⑧) 及び 10/11 (測定⑨) に濃度測定を実施 → 目安値以下														
測定⑩	10/17	南西	0.4	<u>2.5</u>	0.28	<u>3.3</u>	<u>2.3</u>	0.56	0.28	0.39	0.45	0.56	<u>7.0</u>	1.0
成分分析	10/26(※2)			<u>0.2 未満</u>	—	<u>0.2 未満</u>	<u>0.2 未満</u>	—	—	—	—	—	<u>0.2 未満</u>	—
測定⑪	10/19	西	0.8	0.45	0.22	0.34	0.45	0.45	0.22	0.34	0.56	0.34	0.45	0.79
測定⑫	10/20	東	0.7	0.22	0.34	0.11	0.34	0.22	0.34	0.22	0.45	0.34	0.34	0.11
測定⑬	10/21	南東	0.8	0.22	0.11	0.34	0.22	0.22	0.34	0.22	0.34	0.34	0.45	0.34
測定⑭	10/22	—※3	0.2	0.11	0.34	0.22	0.22	0.45	0.22	0.22	0.11	0.11	0.45	0.22
測定⑮	10/23	東	0.7	0.22	0.22	0.34	0.22	0.34	0.22	0.11	0.34	0.11	0.45	0.11
測定⑯	10/24	北東	1.4	0.11	0.11 未満	0.22	0.22	0.11	0.45	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11 未満
測定⑰	10/25	北西	1.2	0.11	0.34	0.11	0.11	0.34	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11	0.11
測定⑱	10/26	北西	1.8	0.22	0.11	0.11 未満	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.22	0.11	0.22

※1 濃度測定結果の単位は f (ファイバー) / ℓ (リットル) で、大気 1 リットル中に含まれる繊維本数を示しており、1 f / ℓ が漏えい監視の目安値となっています。目安値を超えた場合は成分分析を行い、アスベスト繊維数濃度を確認することとされています。

※2 成分分析結果の報告日

※3 計測できないほどの微風
